

PROGETTO ESECUTIVO VALEVOLE COME PROGETTO DI
FATTIBILITÀ E DEFINITIVO



PROVINCIA DI NOVARA

Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici presso l'Istituto Tecnico
Economico O.F. Mossotti di Novara, viale Curtatone 5.

CRONOPROGRAMMA

Gennaio 2018





DURATA DEI LAVORI

Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 100 giorni (cento) naturali e consecutivi.

In fase di esecuzione, quando si sarà a conoscenza della data di inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, trasmettendo alla Stazione appaltante il Programma esecutivo dei lavori in relazione alle fasi esecutive di cantiere ed in base alle lavorazioni previste.

Il cronoprogramma allegato è stato redatto seguendo il Metodo Gantt, organizzando la griglia secondo le seguenti grandezze:

- a) Asse delle ascisse: tempi di esecuzione dei lavori espresso in settimane;
- b) Asse delle ordinate: fasi di lavoro previste.

Si allega, con rappresentazione mediante istogrammi, la durata e la collocazione temporale di ciascuna delle fasi prese a riferimento per l'esecuzione delle opere.


Si precisa che le sovrapposizioni che si evidenziano nel cronoprogramma sono solo temporali, in quanto nelle varie aree di cantiere non sono previste sovrapposizioni di lavorazioni.

Visto le interferenze che le tipologie di lavorazione comportano, è preferibile svolgere i lavori durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica.



CRONOPROGRAMMA LAVORI

" Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici presso l'Istituto Tecnico Economico O.F. Mossotti di Novara, viale Curtatone 5. "

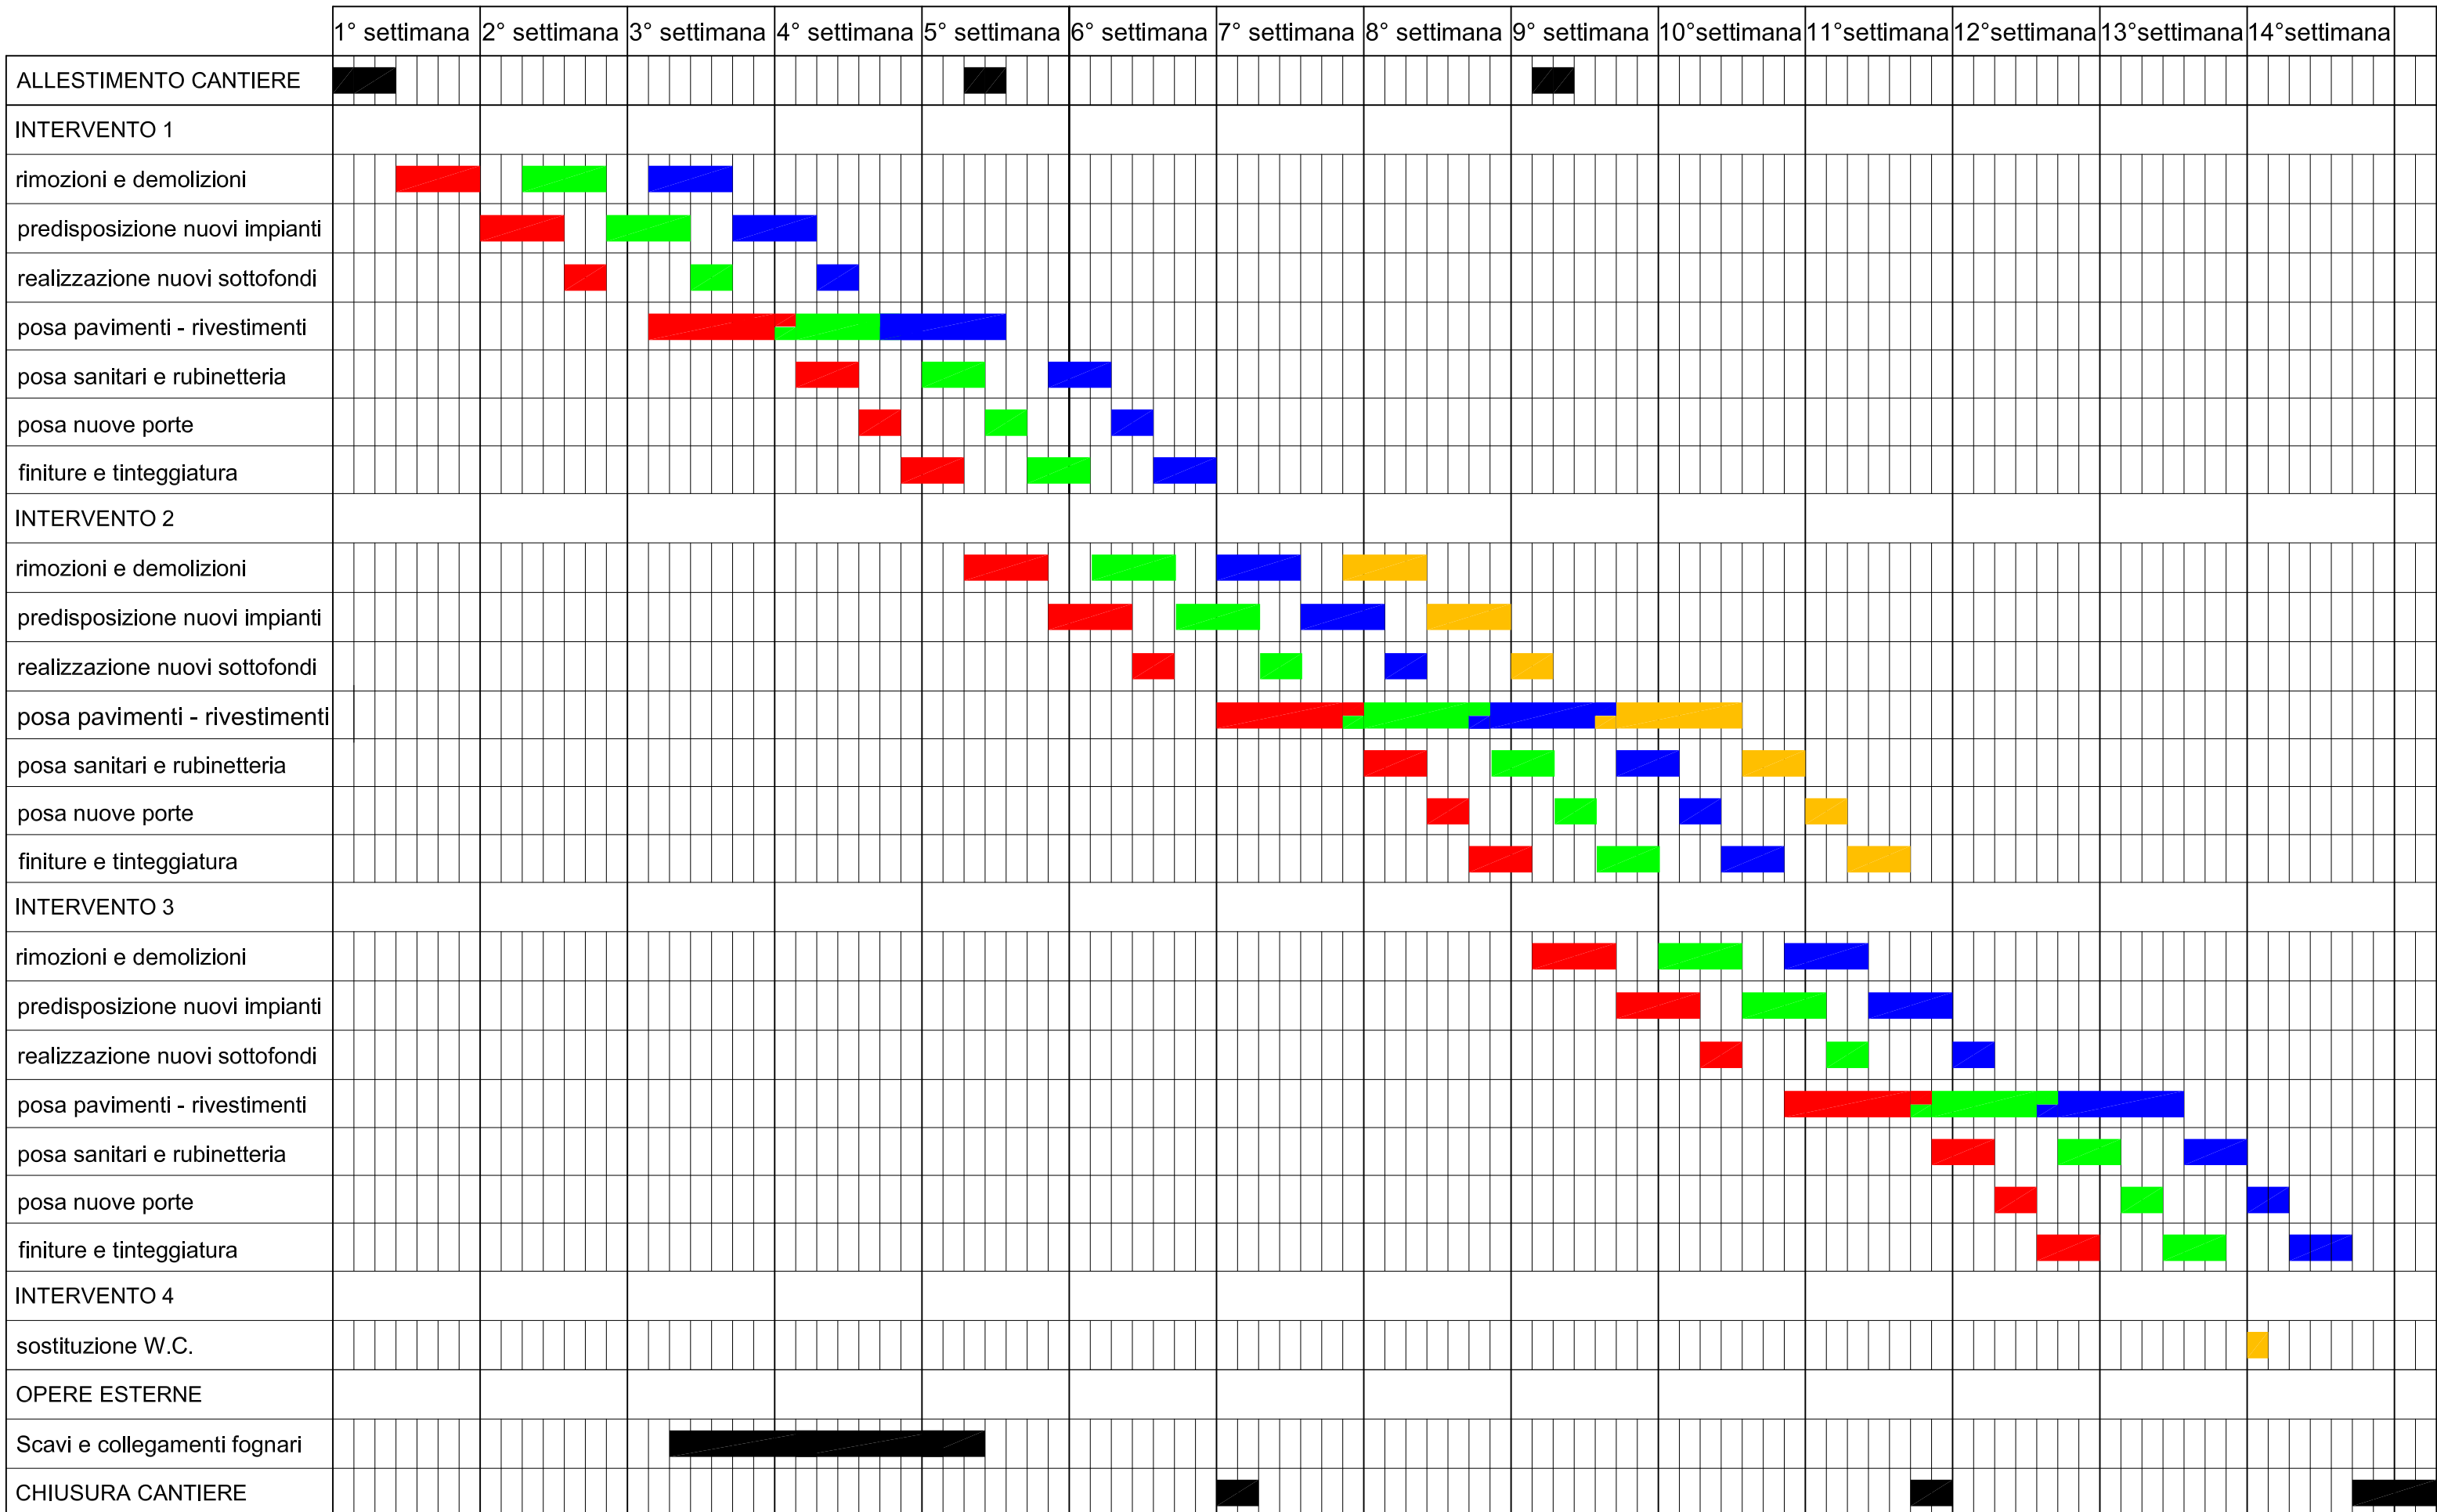

TOTALE GIORNI DI LAVORO: 100

■ A PIANO PRIMO ■ A PIANO SECONDO ■ A PIANO TERZO ■ A PIANO QUARTO
